



लमही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लमही, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०



लमही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लमही दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



नगर प्रमुखको सन्देश

राप्ति उपत्यकाको रूपमा परिचित दाङ देउखुरी उपत्यकाको विचमा अवस्थित लमही नगरपालिका वि. सं. २०७१ सालमा स्थापना भएको हो । यस नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक तथा पुर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक वर्ष वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुदै आएको छ। नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नगरपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको अधिनमा रहि विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरु प्रवाह गरिदै आएको छ ।

आ.व. ०७९/०८० मा यस नगरपालिकाबाट संचालन तथा सम्पादन भएका क्रियाकलापहरु, विभिन्न वडा कार्यलय तथा शाखाहरुबाट प्राप्त भएका विवरणहरुलाई एकिकृत गरि प्रगती प्रतिवेदनका रूपमा तयार पारिएको छ। यसरी तयार पारिएको वार्षिक प्रगतिलाई नगरस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिन्छ । यस प्रतिवेदनले नगरपालिकाबाट प्रवाह भएका र हुने सेवाहरुलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा म विश्वस्त छु । प्रस्तुत विषयमा आ.व. ०७९/०८० मा यस नगरपालिकाबाट संचालन भएका योजनाहरु तथा महत्वपूर्ण कार्यहरु, खर्च विवरण, प्राप्त उपलब्धिहरु समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले प्रायः सबै क्षेत्र तथा वस्तुगत आवश्यकता र वित्तीय यथार्थलाई समेट्ने प्रयास गरेको भएतापनि सिमित समय तथा श्रोत साधनको सीमाभित्र गरिएको अध्ययन आफैमा पूर्ण हुन सक्दैन । यसलाई समय सन्दर्भ अनुसार निरन्तर परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने हस्तान्तरणको अवस्था, कार्य सम्पादन अवस्था र उपलब्धि पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस नगरपालिकाले विगतका आर्थिक वर्षहरुमा पनि वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आईरहेको साथै वार्षिक प्रगती विवरण पुस्तिकाकै रूपमा तयार गरि आम नगरवासी विच सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ। यसले नगरपालिकाको वार्षिक प्रक्षेपित नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक रूपमा सम्पादित कामको भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धी चित्रण गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला सबैलाई उपयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु । यस नगरपालिकाको समय परक गतिशिलताको लागि साझा चासो, चिन्तन एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरनुहुने श्रदेय सबै नगरवासीहरुमा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नगरपालिकाको यो प्रगती विवरण तयार गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी परिवारमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

जोगराज चौधरी
नगर प्रमुख



लमही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लमही दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



नगर उप - प्रमुखको सन्देश

लमही नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भएका संपूर्ण गतिविधिहरू समेटेर तयार गरिएको यो पुस्तिका तयार गर्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम यस लमही नगरपालिकामा हरेक वर्ष बार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट स्वीकृत भई योजना तथा कार्यक्रमहरू संचालन हुदै आईरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा संचालन भएका सम्पूर्ण कार्य प्रगतीलाई समावेश गरि बार्षिक प्रगति विवरण तयार गरिएको छ ।

राज्यको पुनः संरचनाको शिलशिलामा स्थापित यस नगरपालिकाको यथार्थ विद्यमान अवस्था झल्काउने वस्तुस्थिती विवरण तयारीले नगरको विकासको वर्तमान अवस्थालाई चित्रित गरेको छ । यस कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई निरन्तर र नियमित बनाउन सहयोग पुग्यो हुने आदरणीय जनप्रतिनिधि ज्यूहरू, कार्यालयका कर्मचारीहरू साथै सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

आ.व.२०७९/०८० मा सम्पादन भएका कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्नाले कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने छ । सामाजिक, आर्थिक तथा पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गरेका लगानीलाई तथ्यांकीय ढाँचामा एकृकित गरी यो पुस्तिका तयार गरीएको छ र यसले भविष्यमा गरिने विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई मार्ग दर्शनको रुपमा काम गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु र आगामी दिनमा यस नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवा थप प्रभावकारी होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

लक्ष्मी योगी
नगर उपप्रमुख



लमही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लमही दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई


स्थानीय सरकारको हैसियतले लमही नगरपालिकाले नगरवासीहरूको अवश्यकता र प्राथमिकतामा रही विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम र महत्तम प्रयोग र परिचालन गरी सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । परदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व यसका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन । आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक प्रगती विवरण नगरवासी र यस नगरपालिकाको विकास व्यवस्थापन र गतिशीलतामा चासो तथा सरोकार राख्नुहुने सम्बद्ध सबैका जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३० मा नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान नगरसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आय र व्ययको अनुमान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भई सोही अनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन तथा सम्पादन भइरहेका छन् । आ.व. २०७९/०८० मा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू तथा विषयगत शाखा उपशाखाहरूबाट सम्पादन भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूको विवरण एकिकृत गरी वार्षिक प्रगती विवरण तयार गरिएको छ ।

आ.व.२०७९/०८० को लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण, शसर्त, समपुरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेश सरकारबाट समानीकरण, शसर्त, समपुरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट तथा आन्तरिक आय गरी कुल बजेट रु. १,४४,३०,९८,७५७।- मध्ये कुल खर्च रु. ९६,६०,६४,१५०।९ हुन गएको छ । जुन ६६.९४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नगरपालिकाबाट आवधिक रूपमा सम्पादित कामहरूको यथार्थपरक विवरणको पुस्तिका तयार गरि सबैको सामु पस्किएका छौं । यस पुस्तिकामा महत्वपूर्ण तथ्य एवम् तथ्यांक समावेश गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । तथापी प्रकाशित यस प्रगति विवरणलाई तथ्यांकको हिसावले अझ बढी समावेशी बनाउन तथा आम नागरिकको भावना र अपेक्षा समेट्न ध्यान नपुगेको कुराहरू हाम्रो सुझाव पेटिका वा सामाजिक सन्जाल मार्फत पृष्ठपोषण दिनुभई अगामी दिनमा उचित मार्गदर्शन प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आम नगरवासी, जनप्रतिनिधी ज्यूहरू र कर्मचारी परिवारमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । धन्यवाद ।

देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

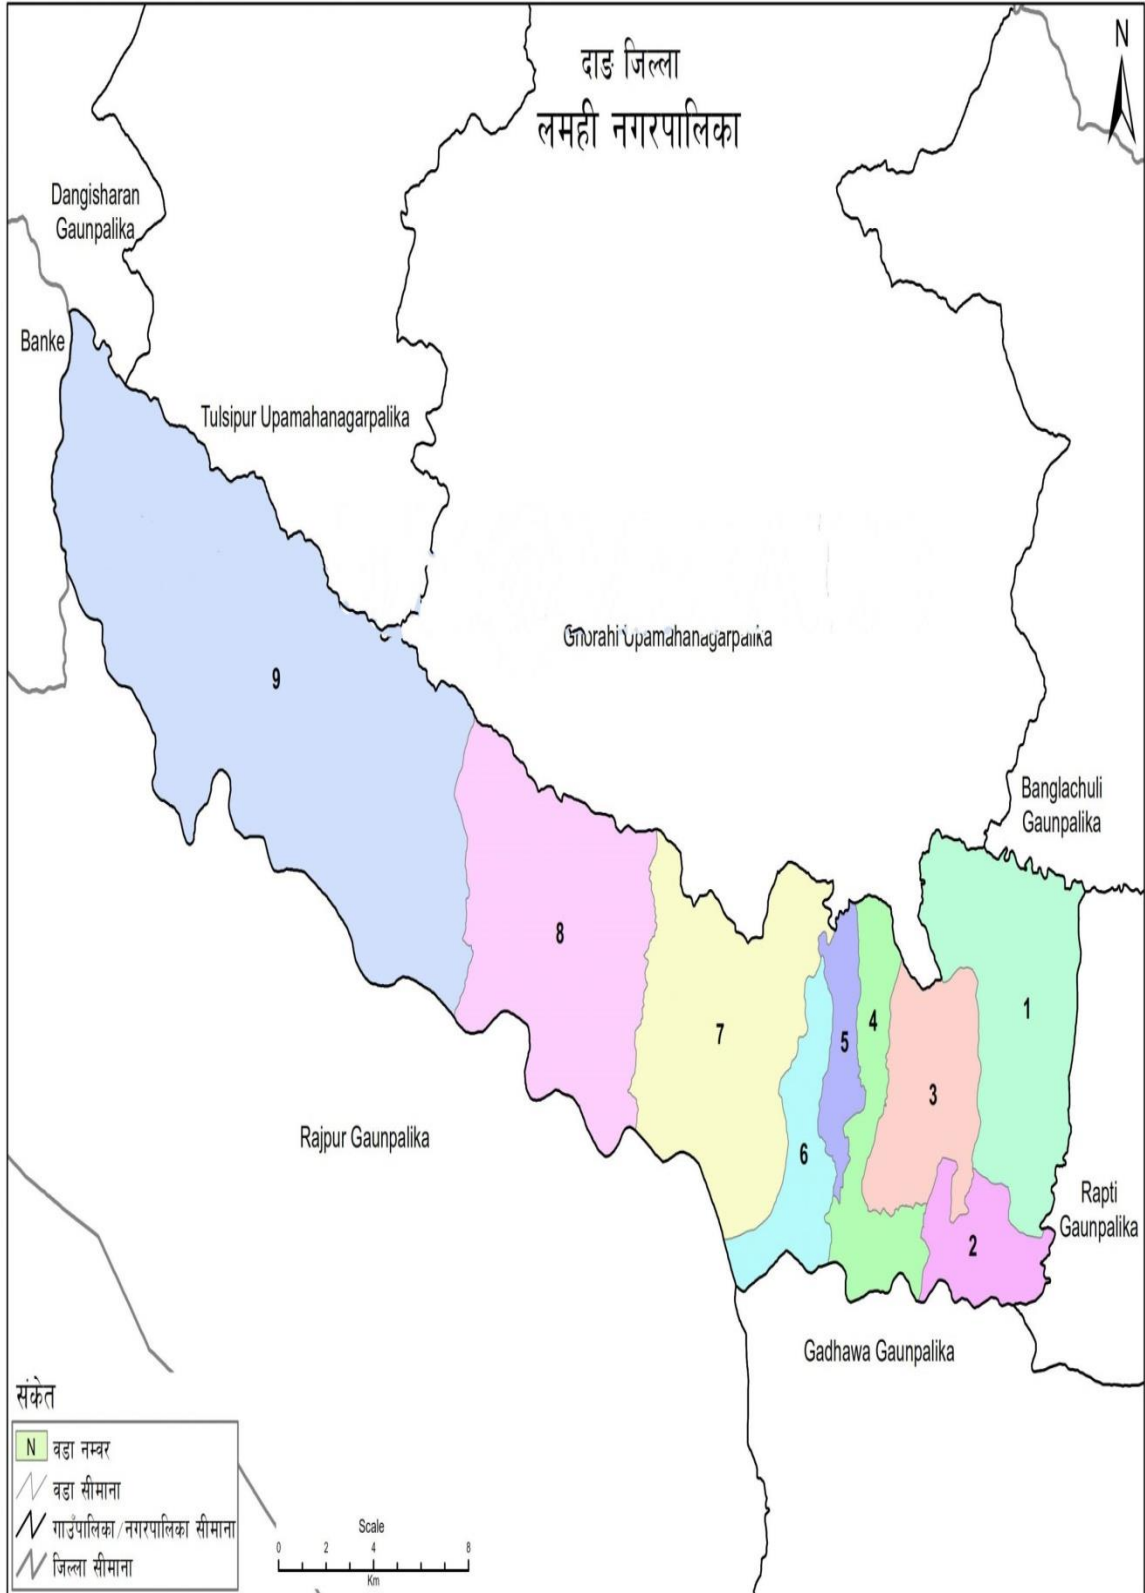

स्रोत: स्थलरूप नक्सा (स्केल १:२५०००/१:५००००), नापी विभाग र जनगणना २०६८, केन्द्रिय तथ्यांक विभाग
तयार पार्ने: गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग

Projection System: MUTM, Spheroid - Everest 1830
LLRC, 2016

विषय - सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पेज नं.
१	राजस्व उप-शाखा	१
२	व्यवसाय घर दैलो दर्ता नवीकरण शिविर	३
३	स्वास्थ्य शाखा	३
४	शिक्षा तथा खेलकुद शाखा	४
५	पूर्वाधार विकास शाखा	६
६	पशु सेवा शाखा	१०
७	कृषि विकास शाखा	१५
८	महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा	१६
९	बाताबरण, सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा	१७
१०	सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा	१८
११	रोजगार सेवा शाखा	१९
१२	नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना	१९
१३	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा)	२०
१४	न्यायीक समिति	२१
१५	पञ्चिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा	२२
१६	भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र	२३
१७	भवन बस्ती विकास शाखा	२३
१८	वडागत विवरण	२३
१९	नागरिक आरोग्य केन्द्र	४९
२०	लमही अस्पताल	४९
२१	नगरपालिकाको आर्थिक प्रगति	४९
२२	कार्यक्रमका फोटोहरु	५०

२०७८ को जनगणना अनुसार

स्रोत : जनगणना २०७८

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	जम्मा जनसंख्या	५९,०५०
२	महिला	३०,५४९
३	पुरुष	२८,५०१
४	घरधुरी	१३,४५८

विद्यालय/संस्थाहरु

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	क्याम्पस	१	
२	सामुदायिक विद्यालय	२७	
२.१	माध्यमिक विद्यालय	१०	
२.२	आधारभूत विद्यालय	१७	
२.३	बालविकास केन्द्र	३०	
३	सहकारी संस्था	५८	
४	टोल विकास संस्था	११८	१ देखि ९ वडामा

स्वास्थ्य संस्थाहरु

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	अस्पताल	१	१५ शैयाको
२	स्वास्थ्य चौकी	२	वडा नं. २ र ८ मा
३	नगर स्वास्थ्य केन्द्र	८	
४	नागरिक आरोग्य केन्द्र	१	वडा नं. ५ मा

पूर्वाधार विकास तर्फ भएका कार्यप्रगति

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	सडक कालोपत्रे	८.५ कि.मी.	
२	ग्राभेल	२५ कि.मी.	
३	पक्की नाला	९.५ कि.मी.	
४	पक्की पुल	२ वटा	वडा नं. ३ र ४ मा
६	कल्भर्ट	१३ वटा	
७	झोलङ्गे पुल	१	वडा नं. ९ मा
८	कच्ची कुलो निर्माण	१८ कि.मी.	
९	सामुदायिक भवन निर्माण	४ वटा	
१०	होमस्टे स्थापना/सुधार	१	वडा नं. ७ मा

S.N.	Project Name	Ward	Agreement Amount	Expenditure Amount	Progress	Bhautik Progress in %	Arthik Progress in %
1	Construction of Black top work at Kaudiya Highway to Khanepani Tank	1	34,73,602.03	9,81,221.38	Running	50%	29%
2	Construction of Black top work at Srighau Milan Chowk to Kaliram Home	2	34,09,798.85	14,05,000.00	Running	60%	42%
3	Construction of Black top work at Tharu Kalyankari Bhawan to Bal Janta Ma Vi Road	3	41,70,407.66	41,33,678.57	Completed	100%	99%
4	Construction of Black top work at Arnawa Chowk to Baeldada Road	4	39,94,368.95	39,54,322.04	Completed	100%	99%
5	Construction of Black top work at Sunkholi Sadak	5	49,27,912.68	42,42,613.77	Completed	90%	86%
6	Construction of Black top work at ward office Road	6	46,95,655.50	46,64,493.24	Completed	100%	99%
7	Construction of Black top work at Hasnapur Road	7	44,15,522.69	43,60,805.40	Completed	100%	99%
8	Construction of Black top work at Gojhena Dhanpuruwa & Rihar Taruliya Road	8&9	75,57,219.30	45,78,284.69	Completed	100%	60%
9	Construction Black Top Work at Rihar Road	9	2,76,54,393.05	2,30,00,00.00	Completed	100%	83%
10	Construction of Black top work at Keruniya Galli to Purba Maruwa Road, Ward no. 2	2	38,28,798.80	38,11,564.34	Completed	100%	99%

11	Construction of Black top work at Nari Highway Chotelal to Khelmaidan Road, Ward no. 1	1	74,57,520.74	25,63,013.27	Running	50%	34%
12	Construction of Black top work at Sano Nadi to Anand Chaudhary Home, Ward no. 2	2	37,93,992.18	37,12,957.71	Completed	100%	98%
13	Construction of Upgrading works at Sundabari to Sitalapur Road, Ward no. 1	1	56,39,775.39	55,15,391.01	Completed	100%	98%
14	Road Upgrading works at Bhatarkundi Paite Lauri Rihar Sadak, Ward no. 9	9	63,31,070.02	39,00,000.00	Running	70%	62%
15	Construction of Roadworks at Bhauka to Uchanimbu Road, Ward no. 8	8	58,16,278.82	18,99,195.75	Running	50%	33%
16	Construction of roadworks at Baltara Majhghau to Bhaiskorma Road, Ward no 3	3	25,24,574.39	25,19,763.27	Completed	100%	99%
17	Construction of Black top work at Kantipur Road, Ward no 3	3	41,50,656.70	40,78,437.81	Completed	100%	98%
18	Construction of Black top work at Chailahi to Baeldada Road, Ward no 4	4	35,99,781.70	31,17,440.05	Completed	90%	87%
19	Construction of Black top work at Adarsha Tol, Sworgadwari Tol and Anandanagar Tol, Ward no 5	5	78,14,353.17	78,11,162.32	Completed	100%	99%

20	Construction of Blacktop work at Badka maharawa to chutki maharawa, Ward no 6	6	80,84,848.29	78,15,708.23	Completed	100%	97%
21	Construction of Black top work at Uchanimbu road, Ward no 7	7	32,39,738.36	0	Running	50%	0%
22	Upgrading and construction of Damodar road works at ward no 7	7	38,42,124.30	14,16,271.85	Running	50%	37%
26	Construction of Baghai Sota Bridge	4	2,93,22,245.80	2,50,65,491.20	Running	100%	85%
27	Construction of Baghdhaila Sota Bridge	3	1,89,12,673.48	1,06,89,066.87	Running	100%	57%
					Total	77.78%	66%

योजना तथा निर्माण अन्तर्गत भएका कार्यप्रगति

क्र.सं.	विवरण	योजनाको संख्या					
		१ लाख भन्दा कम	१ लाख देखि ५ लाख सम्म	५ लाख देखि २० लाख सम्म	२० लाख माथि ५० लाख सम्म	५० लाख माथि	जम्मा योजना संख्या
१	भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गतका योजनाहरू	१५	१७५	१७६	१४	२६	४०६
२	अन्य कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू	२६	८५	१५	४	-	१३०
	जम्मा	४१	२६०	१९१	१८	२६	५३६

१. राजस्व उप-शाखा:

आ.व. : २०७९/०८० बजेट उपशीर्षक : राजस्व शाखा				
क्र.सं.	शीर्षक विवरण	लक्ष्य २०७९/०८०(रु.)	संकलित राजस्व असार मसान्त सम्मको प्रगति (रु.)	प्रगति प्रतिशत
१	एकीकृत सम्पत्ती कर	५,०००,०००.००	२,४०६,३५८.७४	४८.१०
२	भूमीकर / मालपोत कर	५,०००,०००.००	२,६६४,१७७.८६	५३.३०
३	घर बहालकर	५,०००,०००.००	५,३७५,५५२.१२	१०८.००
४	शिक्षा सेवा शुल्क (शैक्षिक संस्था)	५००,०००.००	०.००	०.००
५	साना सवारी साधन कर	५००,०००.००	०.००	०.००
६	व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर	५,०००,०००.००	३,१९९,३५३.००	६४.००
७	अखेटो पहारमा लाग्नेकर तथा निकासी कर वनजन्य, पशुजन्य तथा अन्य उत्पादन	३,०००,०००.००	१०१,४०५.००	३.३८
८	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३००,०००.००	६३०,३००.००	२१०.००
९	नाता प्रमाणित दस्तुर	३००,०००.००	२१८,२००.००	७२.७०
१०	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	६००,०००.००	१,०६८,८१०.५०	१७८.००
११	कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम	५००,०००.००	०.००	०.००
१२	सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट प्राप्त रकम	१००,०००.००	०.००	०.००
१३	सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय	६००,०००.००	१०९,५००.००	१८.३०

१४	न्यायिक दस्तुर	५०,०००.००	४,६५०.००	९.३०
१५	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	५०,०००.००	६९,५००.००	१३९.००
१६	परीक्षा शुल्क	३००,०००.००	१५१,६००.००	५०.५०
१७	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	१,०००,०००.००	६४२,७६८.००	६४.३०
१८	नक्सापास दस्तुर	२,५००,०००.००	७२७,१८५.५२	२९.१०
१९	सिफारिस दस्तुर	१०,०००,०००.००	८,६७३,०७५.००	८६.७०
२०	अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम	४००,०००.००	२१,०००.००	५.२५
२१	अन्य सेवा शुल्क (सरसफाई)	१,५००,०००.००	२,०८७,६०९.००	१३९.००
२२	लगत संकलन भूमीहीन तथा अव्यवस्थित वसोवास जग्गा वितरणबाट प्राप्त राजस्व	१४१,०००,०००.००	०.००	
२३	घरनक्सा अभिलेखीकरण दस्तुर	१,५००,०००.००	०.००	०.००
२४	अन्य दस्तुर	२,५००,०००.००	२,६९२,९१९.८०	१०८.००
२५	निकासी कर नदीजन्य पर्दाथ	१०,०००,०००.००	०.००	०.००
२६	खानी रोयल्टी (नदीजन्य पर्दाथ)	८०,०००,०००.००	३,२२६,०९०.००	४.०३
२७	घर जग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर	६०,०००,०००.००	२२,७२९,८०८.६१	३७.९०
२८	वन रोयल्टी	१५०,०००.००	८,०००.००	५.३३
२९	अन्य मनोरञ्जन कर	५०,०००.००	१८,५००.००	३७.००
३०	विज्ञापन कर	६००,०००.००	६४२,५१०.००	१०७.००
	जम्मा	३३८,०००,०००.००	५७,४६८,८७३.१५	१७.००

व्यवसाय नविकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपश्चात भएको प्रगति तपशिल वमोजिम रह्यो ।

क्र. स.	वडा कार्यलयको नाम	शिविर संचालन अवधि	दर्ता संख्या	नवीकरण संख्या	जम्मा रकम रु.
१	८ नं वडा	२०७९।०६।९	२४	११	६३,१६०
२	९ नं वडा	२०७९।०६।९	१७	१५	४०,१८५
३	५ नं वडा	२०७९।०६।११ र १२	२१	७४	३,०६,५१०
४	६ नं वडा	२०७९।०६।११ र १२	४	३०	३७,१००
५	७ नं वडा	२०७९।०६।११	५	११	३१,४४०
६	४ नं वडा	२०७९।०६।१२ र १३	६	२५	३५,८००
७	२ नं वडा	२०७९।०६। १३ र १४	११	५३	७७,८२०
८	३ नं वडा	२०७९।०६।१२ र १३	२३	८	७२,२९०
९	१ नं वडा	२०७९।०६। ३१	१३	८	३८,७३५
	जम्मा		१२४	२३५	७,०३,०४०

- ९ वडामा जम्मा २५७ जनालाई कर सम्बन्धि जानकारी प्रदान गर्दै कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
- ९ वटा वडामा व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण शिविर संचालन गरिएको छ जसबाट जम्मा १२४ नयाँ दर्ता भएका छन् भने २३५ व्यवसायहरु नविकरण गरिएको छ ।

२. स्वास्थ्य शाखा :

क्र.सं.	विवरण	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कै
१	स्वास्थ्य शाखा सशर्त	४,५९,७८,०००	८७.६	३,६०,९१,०००	७८.५	
२	स्वास्थ्य शाखा आन्तरिक	३,१७,५०,०००	७९.४३	१,३१,५१,०००	४१.४२	
	जम्मा	७,७७,२८,०००	८३.५१	४,९२,४२,०००	६३.३५	

- १) सोनपुर स्वास्थ्य चौकीमा पोषण उपचार केन्द्र (OTC) स्थापना गरियो ।
- २) हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन अभियान कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
- ४) ४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई IMPLANT को तालिम प्रदान गरियो ।
- ५) औषधीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नका लागि ३ जना तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सूचिकृत गरियो ।
- ६) सतवरिया स्वास्थ्य चौकी परिसर भित्र बन्दै गरेको भवनको निर्माण कार्य पुरा गरियो ।
- ८) Injection Oxytocin भण्डारणका लागि ILR Freeze खरिद गरियो ।
- ९) समुदाय स्तरमा पोषिलो खानाको प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी आम समुदायलाई स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रोत र साधनको प्रयोग गरी पोषिलो खाना बनाउने तरिका सिकाइयो ।
- १०) क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपड्ताल कार्यक्रम अन्तर्गत सोनपुर र बन्गैमा क्षयरोग स्क्रिनिङ्ग क्याम्प सञ्चालन गरियो ।
- ११) Health Information management System (HMIS) को परिमार्जित Recording / Reporting Tools हरुका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जानकारी दिनका लागि ३ दिने Revised HMIS Tools सम्बन्धि तालिम सम्पन्न गरियो ।
- १२) लमही नगरपालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका सुनिश्चितता एवं दीगोपना घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो ।
- १३) दादुरा रुवेला खोप अभियान, कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन जस्ता प्रतिकारात्मक सेवाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरियो ।
- १४) सतवरिया र सोनपुर स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि चाहिने उपकरणहरू एवं अन्य रिएजेन्टहरू खरिद गरियो ।
- १५) लमही नगरपालिकाका २७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक औषधि एवं उपकरण सहित २७ वटा प्राथमिक उपचार किट खरिद गरियो ।
- १६) लमही नगरपालिकाका ८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ६ कक्षा देखि १० कक्षा सम्म अध्ययनरत करिब ११४५ जना चौधरी समुदायका छात्रछात्राहरूको सिकल सेल एनिमिया जाँचका लागि रक्त परिक्षण गर्ने कार्य गरियो ।
- १७) “उज्यालो अभियान साझेदारी कार्यक्रम” अन्तर्गत लमही आँखा अस्तालसंग सम्झौता गरी करिब ४०० जना लमही नगरवासीको आँखाको अपरेशन गरियो ।

३. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

क्र.स	विवरण	विनियोजित रकम रु.	भौतिक प्रगति %	खर्च रकम रु.	वित्तीय प्रगति %	कैफियत
१	संघीय सशर्त तर्फ	१७,०८,७१,०००	९५	१५,८०,२३,३००	९२	
२	मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार	७०,००,०००	१००	६७,७९,१९८	९७	
३	आन्तरिक तर्फ	६,१४,४९,०००	७३.७७	३,२३,००,६१९	५२.५६	
	कुल जम्मा रकम रु.	२३,९३,२०,०००।	८९.३३	१९,७१,०३,११७	८०.६६	

- सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि शिक्षकहरूको नियमितता र भौतिक रुपमा विद्यालयको अनुगमन गर्नका लागि सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा ई-हाजीरी र सि.सि टि.भि क्यामरा जडान कार्य सम्पन्न गरियो ।
- कक्षा छाड्ने दर घटाई विद्यालय र पढाई प्रतिको लगाव बढाउन अति विपन्न परिवारका २०० जना विद्यार्थीलाई पोशाक र स्टेशनरी सामग्री वितरण गरियो ।
- भवन तथा कक्षाकोठाको अभावमा दुई वटा कक्षाका विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा तथा कोठाको क्षमता भन्दा धेरै विद्यार्थी राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा विद्यार्थीको रुची बढाउन १ वटा चार कोठे भवन र २ वटा २ कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न ।
- उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गरिव तथा जेहन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत दुई जना एम.वि.वि.एस अध्येयनरत छात्रहरूलाई जनही रु. ३ लाखका रकम वितरण गरियो ।
- लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण गरि सामुदायिक तर्फ कक्षा ६ देखि ८ र संस्थागतमा कक्षा ८ मा सोही पाठ्यक्रम लागु समेत गरियो ।

५. पशु सेवा उप-शाखा:

क्र.स	विवरण (श्रोत)	विनियोजित रकम रु.	खर्च रकम रु.	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	कैफियत
१	आन्तरिक शसर्त	९७,७०,०००	४३,७८,३११	६०	४०.८१	

- सहकारी संस्था सहित करिव २०० जना कृषकहरूलाई बर्षिम घाँसको बीउ वितरण गरिएको छ ।
- सहकारी संस्था सहित करिव १५० जना कृषकहरूलाई जै घाँसको बीउ वितरण गरिएको छ ।
- कृत्रिम गर्भाधान गराएका गाई/भैसीलाई सुत्केरी स्याहार खर्च वापत रु. १००० का दरले जम्मा १४ जना कृषकहरूलाई रु १४,०००।— वितरण गरिएको छ ।
- करिव ३० हजार जनालाई पि.पि.आर खोप सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- बाँझोपन तथा पशु स्वास्थ्य शिविर १० स्थानमा सञ्चालन गरि करिव १७०० जनालाई निः शुल्क सेवा प्रदान गरिएको छ ।

६. कृषि विकास उप-शाखा:

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति %	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत %
१	८८०००००		२५५३८३४	२९.०२

- ५० प्रतिशतमा धानको उन्नत तथा हाइब्रड बीउ अराइज, ६४४४ लगाएत अन्य हाइब्रड बीउ, ५० प्रतिशत अनुदानमा मल्लिङ प्लाष्टिक वितरण, ५० प्रतिशतमा हाइब्रिड उन्नत मकैको बीउ वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा तरकारी तथा च्याउ खेतीका लागी प्लाष्टिक सिट वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा तरकारीको बीउ वितरण, ५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउ स्पान वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

७. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा :

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति %	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत %	कैफियत
१	११४४५०००		२०७००२८	१८.०८	

- वर्ग ९ जना ख वर्ग ५१ जना ग वर्ग ३५ जना घ वर्ग २० जना गरी जम्मा ११५ जनालाई अपांगता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।
- अतिविपन्न ५१ जना जेष्ठ नागरिकहरूलाई औषधी उपचार र सहज जिवनयापनका लागि प्रतिव्यक्ति रु. ७०००/- का दरले आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।
- बालविवाह सम्बन्धी अभिमुखिकरण र उद्घोषण तालिम संचालन गरिएको छ ।
- हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका सेवा केन्द्र मार्फत ४५ जना घरेलु तथा लैंगिक हिंसा पिडित महिलाहरूलाई आश्रय र मनोपराामर्श प्रदान गरिएको छ ।

८. वातावरण, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन शाखा

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	१३,६७०,०००.००		७,१०३,९३१.००	५२	

- लमही नगरपालिका वडा नं. ५ जैविक विविधता पार्कमा खुला व्यायामशाला सञ्चालनमा आएको छ ।
- लमही नगरपालिका वडा नं. ९ मा रहेको गौशालाको स्तरोन्नति गरि ३५० गाईहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
- नगरपालिकाको परिसर सौन्दर्यकरण गरिएको छ ।
- गत असोजमा आएको बाढीबाट प्रभावित १२१२ जना बाढी पिडितहरूलाई राहत रकम रु. १ करोड २० लाख र ३०० घर परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न वितरण, अस्थायी आवासको व्यवस्थाको साथै खानेपानीको व्यवस्था सहित उद्धार गरिएको थियो । बाढी प्रभावित भई अस्थायी आवासमा उद्धार गरिएका करिब ५० महिलाहरूको लागि सेनिटरी हाईजेन किट (Heighen Kit) वितरण गरिएको थियो ।
- वडा नं. ९ तेलियामा विद्यालय जादै गरेका बालबालिका चढेको डुङ्गा पल्टिदा २४ जना बालबालिकाको लागि आवश्यक विद्यालय पोशाक, झोला, जुता, किताब - कापी र कलम वितरण गरिएको छ ।
- वडा प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लमहीलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको छ ।

९. सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा :

विनियोजित रकम रु	खर्च रु	भौतिक प्रगति प्रतिशतमा	बित्तीय प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत
५३,००,०००	४४,२८,०००	८१	८३	

- प्रविधिमैत्री सभाहलका लागि सामग्री जडान भएको छ ।
- प्रविधिमैत्री कार्यपालिका बैठक कक्षका लागि सामग्री जडान गरिएको छ ।
- बजार क्षेत्रमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणकालागि १३ वटा सि.सि.टि.भी क्यामेरा वडा प्रहरी कार्यालय, लमहीको सुझाव अनुरूप अति सम्बेदनशिल स्थानहरूमा जडान गरिएको छ ।
- कर प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउनकालागि करचुक्ता प्रमाणपत्र स्टोरेज एप्लिकेशन निर्माण गरिएको छ ।
- स्मार्ट कृषी एप्लिकेशन र एकिकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिएको छ ।

नागरिक आरोग्य केन्द्र :

क्र.सं.	बजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	१५,००,०००	१३,९२,९०५	९२.८६	

लमही अस्पताल

क्र.सं.	बजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१		३,७१०,२९२.००	३,७१०,२९२.००	३७.४८	

१०. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम :

कुल बजेट रु. : ५०,९९,०००/- कुल खर्च : ४८,६२,९५६।-								
सुचिकृत बेरोजगार संख्या : ७४६ लक्ष्य : रोजगारीमा संलग्न हुनेको संख्या = ८७ जना, कुल रोजगारी सिर्जना दिन संख्या = ८,४२८ दिन								
वडा नं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम (रु.)	लागत इस्टिमेट (रु.)	खर्च रकम (रु.)	वित्तीय प्रगति (%)	रोजगारिमा संलग्नको संख्या	जम्मा रोजगारी दिन संख्या	कैफियत
कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना (नेपाल सरकार)								
९	तरुलियामा डयाम निर्माण	१५५७९००	१५५७९००	१५४२३२१	९९	२७	२६७३	
७	बनगई देखि हसनापुरसम्मको नयाँ सडक निर्माण	१२११७००	१२११७००	११२६८८१	९३	२१	१९५३	
जम्मा		२७६९६००	२७६९६००	२६६९२०२	९६	४८	४६२६	
कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना युवा रुप								
५	अजम्बरी जैविक पार्क निर्माण तथा लमही गल्लीमा कुलो मर्मत	११५४०००	११५४०००	११५४०००	१००	२०	२०००	
८	बनबगिया तथा गोझेना खोला मर्मत सम्भार	९२३२००	९२३२००	८७७०४०	९५	१६	१५२०	
१	महेन्द्र राजमार्ग देखि सोनपुर जाने सडक मर्मत सम्भार	२३०८००	२३०८००	१६२७१४	७०.५	३	२८२	
जम्मा		२३०८०००	२३०८०००	२१९३७५४	८८.५	३९	३८०२	
कुल जम्मा		५०७७६००	५०७७६००	४८६२९५६	९५.७७	८७	८४२८	

११. नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना :

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	रोजगार पाउनेको संख्या	कैफियत
१	१४,३७,०४,७५७	१००	१२,९८,७५,८०२.०६	९०.३७	२८६०	

- नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना अन्तर्गत आ.व. ०७९/८० को लागि प्राप्त जम्मा रकम रु १४,३७,०४,७५७।— (अक्षरूपी चौध करोड सैतिस लाख चार हजार सात सय सन्ताउन्न) मध्ये ७६ वटा योजना सम्पन्न गरि रु. १२,९८,७५,८०२.०६।— (बाह्र करोड अन्ठाउन्न लाख पचहत्तर हजार आठ सय दुई) खर्च भएको छ जसको खर्च प्रतिशत ९०.३५ हुन आउछ । यस कार्यक्रमबाट जम्मा २८६० जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

११. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम :

क्र.सं.	विनियोजित रकम रु.	पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने संख्या	दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने	जम्मा लाभग्राही	खर्च रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१	९२,९०,०००	१५७	६३	२२०	८३,४४,०००	८८.२६

- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छाना विस्थापित गरि टिनको छाना छाउनका लागि आ. व २०७९/०८० मा लमही नगरपालिकाका वडा नं. १ देखि ९ सम्म जम्मा ६३ जना लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता रकम बुझि छाना छाएर अन्तिम किस्ता रकम समेत प्राप्त गरिसकेका छन् भने जम्मा १५७ जना लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरि खरको छाना छाउने कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । छाना छाईसकेपछि अनुगमन गरि अन्तिम किस्ता रकम उपलब्ध गराईनेछ ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा):

क्र.स.	विनियोजित रकम	भौतिक प्रगति	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	३४,००,०००/-	८५.३%	२९,००,०००/-	८५.३%	

- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत वडा न. २, ५ मा सहभागीतात्मक ग्रामिण लेखाजोखा (PRA) कार्यक्रममा १०७ जना सहभागी मध्य ८८ महिला र १९ जना पुरुसको सहभागीतामा PRA कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न. २, ५ मा सम्भाव्य लघु उद्यमिको ७ वटा समुह निर्माण गरियो । जसमा जम्मा ९६ जना महिला सहभागीतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न. २, ५ मा सम्भाव्य लघु उद्यमिलाई उद्यमशिलता विकास तालिम संचालन गरियो । जसमा उद्यमशिलता विकास तालिममा महिला ९४ जना सहभागीतामा तालिम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ लमही नगरपालिका वडा न. २, ५ मा सम्भाव्य लघु उद्यमीलाई उद्यमशिलता विकास तालिम लिएका सहभागीहरु मध्य ९३ जना लाई सिप विकास तालिम प्रदान गरि जस मध्य सिलाई कटाई १६ जना (वडा २ र ५) हाते होजियारी सुईटर बुनाई ४४ जना (वडा २,५), गार्मेन्ट सिलाई ११ जना (वडा ५), र डल कुशन २२ जना (वडा २) सहभागीतामा तालिम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ आ.ब २०७८/०७९ का पुराना उद्यमीलाई स्तरोन्नति सिप विकास तालिम लिएका सहभागीहरु मध्य ४० जना महिला जस मध्य सिलाई कटाई २६ जना (वडा १,९), मखमल जुत्ता चप्पल ७ जना (वडा १), डल्ले च्याऊ उत्पादन ७ जना (वडा ६), सहभागीतामा तालिम सम्पन्न भएको छ।
- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न. २, ५ का सहभागीहरु सिप विकास तालिम प्राप्त गरेका मध्य ६२ जना महिला लघु उद्यमी लमही न.पा ५ मा कुमारी बैक लि. संग लघु बित्तमा पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.७ का स्तरोन्नति तर्फ १४ जना र वडा न. २, ५ सिप विकास तालिम लिएका मध्य नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ ५५ जनालाई प्रबिधि हस्तान्तरण गरियो , जस मध्य हाते होजियारी सुईटर बुनाई लाई ७ थान सुईटर बुनाई मेसिन र टेबल ४४ जना (वडा २, ५), गार्मेन्ट सिलाई तालिम ४ वटा सिलाई मेसिन, ओभरलग (वडा ५), र पशुपालन तालिममालाई राईमिल १ थान र डिजिटल काटा १ थान १४ जना (वडा ७), उद्यमीहरुलाई प्रबिधि हस्तान्तरण गरिएको छ ।
- ❖ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न. २ र ५ का सहभागीहरुलाई सिप विकास तालिम प्राप्त गरेका मध्य ३५ जना महिला लघु उद्यमीलाई अबलोकन भ्रमणलागि घोराही र तुलसीपुरमा रहेका व्यवसाय र उद्योगको अबलोकन गरिएको छ ।

सामी शाखा :

क्र.स.	विवरण	विनियोजित रकम रु.	भौतिक प्रगति	खर्च रकम रु.	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१.	सुरक्षित आप्रवासन शसर्त, शाखा(सामी)	२५-/०००,००,	१००	२२-/३८०,८८,	९१५४.	
२.	सुरक्षित आप्रवासन आन्तरिक, शाखा(सामी)	१०-/०००,००,	१००	१०-/०००.००.	१००	
	जम्मा	३५०००००	१००	३२८८३८०।-	९३	

१. सामी कार्यक्रम अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१,३,७ र ८ मा वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारलाई समेटेर १०१ जनाको समुहमा वित्तिय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श कक्षा संचालन गरियो ।
२. सामी कार्यक्रम अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.१,३,७, र ८ मा वै.रो. संग सम्बन्धित घरपरिवारहरूलाई वै.रो.क कारण वा अन्य कारणले उत्पन्न मनोसामाजिक समस्यालाई प्राथमिक सेवा ३० जना महिला र समुहगत तह मनोसामाजिक परामर्श सेवा १०१ जना महिला, पुरुषलाई सेवा प्रदान गरियो ।
३. सामी कार्यक्रम अन्तर्गत लमही नगरपालिका वडा न.२,६,,७,८, र ९ विदेश गएका घर परिवार र जाने सोच भएका घर परिवारलाई सामुदायिक र गहन अभिमुखी कारण कार्यक्रम गरियो ।
४. सुरक्षित आप्रवासन सेवा केन्द्र उपशाखा लमही (MRC)बाट ३९९६ जनालाई सेवा प्रदान गरियो।
५. सामी कार्यक्रम अन्तर्गत वडा न. १-९ सम्म १९५४ जना लाई सहि सूचना प्रवाह गरियो ।
६. सामी कार्यक्रम अन्तर्गत सिप, तालिममा आवद्ध ५ जनाले लिएको ।

न्यायीक समिती :

पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा:

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा बजेट उपशीर्षक : संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) बजेट प्रकार : चालु अनुदान प्राप्त बजेट उपशीर्षक : राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग - 31401011					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
८०५५६४०१५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)					
१	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च	...	...	१००.००	०
२	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च	...	...	९८.५७	...
३	मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	...	...	९७.९२	...
४	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालनार्थ)	...	...	९५.५६	...
५	विभागले उपलब्ध गराउने विधि/पद्धति अनुसार बडा स्तरबाट घटना दर्तासहा अभियान सञ्चालन	...	...	८३.६५	...
६	एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक दैनिक भत्ता/यातायात खर्च/ईन्धन	...	...	८५.६७	...
७	सञ्चार सामग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पहुँच अभियान सञ्चालन)	...	...	०.००	...
८	अन्य विविध खर्च - आयोजना, सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्तासम्बन्धी विभिन्न बैठकको चियापान लगायतको खर्च	...	...	०.००	...
कुल जम्मा		...	...	८१.८५	...

सामाजिक सुरक्षा:

कुल बजेट	संख्या	त्रैमासिक	वितरण रकम रु
...	...	पहिलो त्रैमासिक	...
	...	दोस्रो त्रैमासिक	...
	...	तेस्रो त्रैमासिक	...
	...	चौथो त्रैमासिक	...
		जम्मा	...

शिर्षक अनुसारको खर्च

शिर्षक	खर्च रकम रु
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	₹ १,००,०००.००
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	₹ १,००,०००.००
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	₹ १,००,०००.००
विधवा	₹ १,००,०००.००
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	₹ १,००,०००.००
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	₹ १,००,०००.००
दलित बालबालिका	₹ १,००,०००.००
लोपन्मुख जाति	₹ १,००,०००.००
जम्मा	₹ १,००,०००.००

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन :

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	अन्य	जम्मा	पुरुष	महिला	अन्य	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
१	९२	८५		१७७	१९	२३		४२	४	९२	६७	२६३	४४	१४३		४२६
२	७	६		१३	४९	३५		८४	६	१२५	२९	१२३	४३	११९		३००
३	३	१		४	२६	२४		५०	३	१२४	९१	२७९	२५	८७		२९७
४	८०	७०		१५०	२६	१६		४२	५	७९	४४	१५०	१८	७३		३३८
५	८५	६८		१५३	१७	३५		५२	१०	१०३	७६	२८३	२६	७८		४२०
६	८३	६२		१४५	२०	१५		३५	८	६५	९१	३२८	२२	७४		३६६
७	७८	६५		१४३	२३	२०		४३	४	८७	२२	४८	३०	६२		३२९
८	१			१	३४	३१		६५	६	११४	२५	४६	२२	५०		२३३
९					१५	१५		३०	४	६८	१९	५४	१२	२८		१३३
जम्मा	४२९	३५७	०	७८६	२२९	२१४	०	४४३	५०	८५७	४६४	१५७४	२४२	७१४	०	२८४२

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी स्थानीय सेवा केन्द्र :

- १) हाल सम्म २ सय २४ भूमिहिन दलित, १ हजार ३ सय २० भूमिहिन सुकुम्बासी र ६ हजार २ सय ०८ अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा ७ हजार ७ सय ५२ घरधुरीको लगत संकलन र निस्सा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- २) नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा नाप नक्साको लागि १ सय ९० वटा नियन्त्रण बिन्दु राख्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
- ३) लमही नगरपालिकाको वडा नं. ४,५,६,७,८ र ९ मा जम्मा ७ सय ९० विगाहा ६ कठ्ठा ५ धुर (५३५.२५ हेक्टर) जग्गा नापी कार्य सम्पन्न भएको र अरू वडामा नापी कार्य भइरहेको छ ।
- ४) नापी भएका वडाहरू ४,५,६,७,८ र ९ को नक्सा बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

भवन तथा बस्ती विकास शाखा :

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१	घर नक्सा पास दर्ता	४०	
२	घर नक्सा पास प्लिनथ लेवल	३५	
३	घर नक्सा पास सुपरस्ट्रक्चर सम्म लागेको	२०	
४	घर नक्सा अभिलेख प्रमाण पत्र नामसारी	४१	
५	न्यायिक समिति जग्गा विवाद फिल्ड रेखाङ्कन	११	
६	सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिल्ड रेखाङ्कन	१२३	

टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिहरूबाट वडागत रुपमा सञ्चालन भएका कार्यक्रम तथा योजनाहरूको प्रगति विवरण

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.१

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,४४,०००.००	६६.६७	७२,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	७०,०००.००	४५,६००.००	६५.१४	२४,४००.००
३	संचार महसुल	६०,०००.००	३५,६००.००	५९.३३	२४,४००.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	४०,०००.००	०.००	०.००	४०,०००.००
५	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	३०,०००.००	१४,५१०.००	४८.३७	१५,४९०.००
६	सवारी साधन मर्मत खर्च	४०,०००.००	७,५५०.००	१८.८८	३२,४५०.००
७	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,०००.००	४७,०२४.००	९४.०५	२,९७६.००
८	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	४०,०००.००	४०,०००.००	१००.००	०.००
९	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री छपाइ	१,५५,०००.००	१,४६,८३२.००	९४.७३	८,१६८.००
१०	पुस्तक तथा पत्रपत्रिका	५५,०००.००	१४,२००.००	२५.८२	४०,८००.००
११	महिला दिदि बहिनीहरुका लागी सिलाइ कटाइ,ढकिया,गुडिया तालिम	५,००,०००.००	१,९६,८१६.००	३९.३६	३,०३,१८४.००
१२	विपन्न वर्गलाई खानेपानी धारा जडान	६,०५,०००.००	०.००	०.००	६,०५,०००.००
१३	वडा कार्यालयको परिसरका लागी गमला, मल, माटो, पुष्प खरिद, डिजाइन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	वडास्तरीय अध्यक्ष कप, यूवा, बाल क्लव, विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता, फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन खेल कार्यक्रम	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.००	०.००
१५	हेल्प डेस्क संचालन	१,३०,०००.००	१,०१,९९३.००	७८.४६	२८,००७.००
१६	लमही जेसिस कार्यक्रम	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१७	अनुभव आदान प्रदान भ्रमण	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
१८	वडा स्तरिय विपद व्यवस्थापन कोष	१,२०,०००.००	५९,१६९.००	४९.३१	६०,८३१.००
१९	विपन्न वर्गलाई खानेपानि धारा जडान	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
२०	ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय लमही का लागि सामग्री खरिद	९९,०००.००	०.००	०.००	९९,०००.००
२१	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	८०,०००.००	५६,०००.००	७०.००	२४,०००.००
२२	विविध खर्च	१,४४,०००.००	१,१८,१८२.००	८२.०७	२५,८१८.००
२३	लमही जेसिज भवन निर्माण कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	नागरिक सचेतना भवनमा फर्स ढलान तथा प्लास्टिक कुर्ची खरिद कार्यक्रम	१,००,०००.००	९६,९९९.००	९७.००	३,००१.००
२५	शितलापुर प्रा.वि. मा पुरानो घर मर्मत सम्भार कार्यक्रम	१,००,०००.००	९६,२१०.००	९६.२१	३,७९०.००
२६	वडा कार्यालयको भवन मर्मत तथा आवश्यक सामग्री खरिद	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
२७	चौतारी सचेतना भवनका लागी प्लास्टर तथा रङरोगन कार्यक्रम	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
२८	प्रहरी चौकी नर्तिलाइ फ्रिज खरिद	२०,०००.००	२०,०००.००	१००.००	०.००

२९	लालमणी सुवेदीको घर देखी बृद्धआश्रम सम्म दुबै तर्फ पक्की नाली तथा बाटो ग्राभेल कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
३०	हाइवेय देखि हरि के सि को घर सम्म पक्की नाली तथा बाटो स्तरोन्नति	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३१	निम बहादुर बस्तेनतको घर देखि खनाल टोल जाने बाटोमा पक्की नाला र बाटो ग्राभेल	४,००,०००.००	३,८७,७००.००	९६.९३	१२,३००.००
३२	पाखापानेको घर देखी बौराहा खोला खानेपानी सम्म बाटो स्तरउन्नति	१२,००,०००.००	०.००	०.००	१२,००,०००.००
३३	खेलमैदान माछापुखरी पुर्व देखी छमा पोखेलको घर सम्म दुबै तर्फ पक्की नाली तथा बाटो ग्राभेल कार्यक्रम	६,००,०००.००	५,८१,६६२.००	९६.९४	१८,३३८.००
३४	पोल तथा होम पाईप व्यवस्थापन	५,४६,०००.००	०.००	०.००	५,४६,०००.००
३५	फलकैया चोक देखी उत्तर भरत चौधरीको घर सम्म दुबै तर्फ पक्की नाली तथा बाटो ग्राभेल कार्यक्रम	३,००,०००.००	२,८७,९७१.००	९५.९९	१२,०२९.००
३६	प्रगतिनगर पुरन चौधरीको घर तर्फ जाने बाटोको उत्तर तर्फ कलभट तथा बाटो ग्राभेल कार्यक्रम	५,००,०००.००	४,८४,३९०.००	९६.८८	१५,६१०.००
३७	तिसुवा खोलामा खानेपानीका लागी मोटर तथा पाइप खरिद कार्यक्रम	३,००,०००.००	२,६९,८७०.००	८९.९६	३०,१३०.००
३८	सुन्डवरीमा रहेको डिप वोरिडका लागी नया मोटर खरीद कार्यक्रम	३,५०,०००.००	३,४८,०००.००	९९.४३	२,०००.००
३९	बालोदय आधारभुत विद्यालयको पर्खाल निर्माण	२,००,०००.००	१,९३,४२४.००	९६.७१	६,५७६.००
४०	बालोदय आधारभुत विद्यालयको खेलमैदानको स्तरउन्नति कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
४१	दिव्य प्रा. वि. बसन्तपुरको खेलमैदान स्तरउन्नति कार्यक्रम	३,००,०००.००	२,७१,६३०.००	९०.५४	२८,३७०.००
४२	सुर्य विनायक मा.वि. मा बाल उद्यान निर्माण कार्यक्रम	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४३	जनसुधार टोल विकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माण कार्यक्रम	३,००,०००.००	२,९०,०००.००	९६.६७	१०,०००.००
४४	सुन्डवरी बन वाटीका पार्क निर्माण कार्यक्रम	१०,००,०००.००	०.००	०.००	१०,००,०००.००
४५	वडा कार्यालयको भवनमा जाली, सिसा पल्ला निर्माण तथा यसी जडान	०.००	०.००	०.००	०.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००.००	४७,५५,३३२.००	४३.२३	६२,४४,६६८.००

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.२

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
--------	-----------------------------------	----------	------	----------	---------

१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	२,१५,०००.००	९९.५४	१,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	८०,०००.००	२२,३००.००	२७.८८	५७,७००.००
३	संचार महसुल	५०,०००.००	३६,५००.००	७३.००	१३,५००.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२५,०००.००	२०,८८२.००	८३.५३	४,११८.००
५	सवारी साधन मर्मत खर्च	५०,०००.००	१३,६८०.००	२७.३६	३६,३२०.००
६	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,०००.००	४६,४५०.००	९२.९०	३,५५०.००
७	केरुनियाँ मन्दिर रंगरोगन	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
८	कार्यालयकालागी आवश्यक सामग्री खरिद	८९,०००.००	०.००	०.००	८९,०००.००
९	कार्यालय सामग्री तथा छपाई	२,००,०००.००	२१,३५५.००	१०.६८	१,७८,६४५.००
१०	पुस्तक तथा पत्रपत्रिका	६०,०००.००	५०,४००.००	८४.००	९,६००.००
११	तिर्थयात्रा (भक्ति समाज)	०.००	०.००	०.००	०.००
१२	वडा स्तरीय विपत सहयोग	१,००,०००.००	५६,८४०.००	५६.८४	४३,१६०.००
१३	हेल्पडेस्क संचालन	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
१४	महिलालाई सिपमुलक तालिम	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
१५	वडास्तरीय थारु नाच/गान कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
१६	वडास्तरीय फुटबल/व्याडमिन्टन/ क्रिकेट/ घैटाफोर कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
१७	जेष्ठ नागरिक/ बालबालिका/ अपाङ्ग सम्मान	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१८	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	११,०००.००	१०,०००.००	९०.९१	१,०००.००
१९	विविध खर्च	१,६९,०००.००	१,६९,०००.००	१००.००	०.००
२०	छिंगतपुर अधुरो पक्की नाली	२,००,०००.००	१,७७,१२९.००	८८.५६	२२,८७१.००
२१	अपाङ्गमैत्री बाटो निर्माण	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
२२	श्रीगाउँ अधुरो पक्की नाली निर्माण	५,००,०००.००	४,८४,७७०.००	९६.९५	१५,२३०.००
२३	उदयको घर देखि छिंगतपुर गाउँसम्म बाटो ग्राभेल	२,००,०००.००	१,५२,९५७.००	७६.४८	४७,०४३.००
२४	केरुनिया गल्ली उत्तर पुलदेखि अर्चनाको घरसम्म पूर्वमा मरुवासम्म कालोपत्रे	५०,००,०००.००	३८,८१,५६४.००	७७.६३	११,१८,४३६.००
२५	अधुरो पक्की नाली बनकट्टा	५,००,०००.००	४,८४,६३५.००	९६.९३	१५,३६५.००
२६	फर्निचर टोल केरुनिया अधुरो पक्की नाली निर्माण र माटो/ पटन ग्राभेल	४,००,०००.००	३,८८,०००.००	९७.००	१२,०००.००
२७	घटुरीया डाँडामा कल्भर्ट निर्माण	६,००,०००.००	५,७९,३०९.००	९६.५५	२०,६९१.००
२८	बनकट्टा बिधुत विस्तार	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००.००	०.००
२९	बरुवागाउँ/छिंगतपुर बिधुत विस्तार	२,५०,०००.००	२,५०,०००.००	१००.००	०.००
३०	सोनपुर बिधुत विस्तार	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००	०.००
३१	वडा कार्यालयको पर्खाल र गेट निर्माण	७,००,०००.००	६,७९,०००.००	९७.००	२१,०००.००
३२	सोनपुर मरुवाथान व्यवस्थान	२,००,०००.००	१,९३,६५९.००	९६.८३	६,३४१.००
३३	खेल मैदान निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००.००	८३,८३,४३०.००	७६.२१	२६,१६,५७०.००

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.३

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,६२,०००.००	७५.००	५४,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	३०,०००.००	१०,२७०.००	३४.२३	१९,७३०.००
३	संचार महसुल	५०,०००.००	४५,२००.००	९०.४०	४,८००.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	५०,०००.००	२६,९९७.००	५३.९९	२३,००३.००
५	सवारी साधन मर्मत खर्च	४०,०००.००	२०,८२५.००	५२.०६	१९,१७५.००
६	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,०००.००	४९,४५०.००	९८.९०	५५०.००
७	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	५०,०००.००	४८,११५.००	९६.२३	१,८८५.००
८	पुस्तक, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३०,०००.००	२३,०८९.००	७६.९६	६,९११.००
९	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	४१,०००.००	०.००	०.००	४१,०००.००
१०	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	७९,०००.००	०.००	०.००	७९,०००.००
११	वडा स्तरीय खेलकुद	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
१२	श्रृंखलाशील अपाङ्ग मैत्री संस्था तालीम संचालन	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	जेष्ठ एकल अपाङ्ग विपन्न नागरिकको लागि जाडोको सिजनमा न्यानो कपडा खरिद	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	हेल्पडेस्क तलव भत्ता	१,५०,०००.००	३१,२७०.००	२०.८५	१,१८,७३०.००
१५	वडा स्तरीय खेलकुद व्यवस्थापन	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००	०.००
१६	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१,५०,०००.००	१,४५,९००.००	९७.२७	४,१००.००
१७	अध्ययन अवलोकन भ्रमण	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
१८	विविध खर्च	१,१८,०००.००	१,१८,०००.००	१००.००	०.००
१९	विविध खर्च	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
२०	घरभाडा	९६,०००.००	४७,९१६.००	४९.९१	४८,०८४.००
२१	मजगाँउ पर्सिहान घर देखि विनोद चौधरीको घर हुदै बम बहादुर चौधरीको सर सम्म बाटो स्तरउन्नती	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
२२	वनगाँउ अनिल चौधरीको घर हुदै भूरीपुर गाँउ सम्म नयाँ कृषि बाटो निर्माण	२,००,०००.००	१,७४,२९०.००	८७.१५	२५,७१०.००
२३	मजगाँउ दक्षिणटोल विष्णु चौधरीको घर हुदै पोगाली चौधरीको घर सम्म बाटो स्तर उन्नती	४,५०,०००.००	०.००	०.००	४,५०,०००.००
२४	वनगाँउ रघुनाथ चौधरीको घर हुदै मजगाँउ सम्म नयाँ कृषि बाटो	२,००,०००.००	१,७८,२४५.००	८९.१२	२१,७५५.००
२५	मजगाँउ वसौरी कुलो देखि पश्चिम तर्फ निर्माणधिन थारु नमुना घर सम्म नाला निर्माण	४,००,०००.००	३,८७,२२४.००	९६.८१	१२,७७६.००
२६	वनगाँउ डि.एन इट्टा उद्योग देखि दामोदर रोड सम्म नयाँ कृषि बाटो निर्माण	५,००,०००.००	४,८२,२८५.००	९६.४६	१७,७१५.००
२७	टिकुलीगढ मरुवाथान देखि पतिराम चौधरीको घर हुदै सुनिताको घर सम्म बाटो ग्रावेल	०.००	०.००	०.००	०.००
२८	नारायणपुर अमृते बलीको घर देखि पूर्व पिपलवोट सम्म बाटो ग्रावेल	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
२९	टिकुलीगढ कुमराहन टोल कृषि गोरेटो बाटो निर्माण	१,५०,०००.००	१,४९,५२२.००	९९.६८	४७८.००
३०	वाल जनता मा.वि. वनगाँउको पर्खाल देखि उत्तर-दक्षिण मंहगु चौधरीकी खेत सम्म नयाँ कृषि बाटो निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
३१	मजगाँउ जगत प्रसाद चौधरीको घरनेर कल्भर्ट निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
३२	फल्कापुर सम्भुको घर देखि पूर्व कौडिया जोड्ने बाटोमा अधुरो पक्कीनाला निर्माण	५,००,०००.००	४,८४,१९२.००	९६.८४	१५,८०८.००

३३	सिरीगाँउ पिपलबोट देखि योगलालको घर सम्म वाटो ग्रावेल	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
३४	उत्तर फल्कापुर बाटो ग्रावेल नाला निर्माण	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
३५	फल्कापुर टुकलाल पौडेलको घर देखि भेगवहादुर अधिकारी सम्मको वाटो स्तरउन्नती	४,००,०००.००	०.००	०.००	४,००,०००.००
३६	मजगाँउ वैरागीटोल देखि दुखराम चौधरीको घर हुदै रामवहादुर चौधरीको घर सम्म वाटो स्तर उन्नती	३,५०,०००.००	३,३९,०२०.००	९६.८६	१०,९८०.००
३७	शिउपुराण घर हुदै पश्चिम खोला सम्म वाटो ग्रावेल	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
३८	वनगाँउ अकलपटिया कल्भर्ट निर्माण	६,००,०००.००	५,७९,८६७.००	९६.६४	२०,१३३.००
३९	पोल तथा ह्युमपाइप खरीद	०.००	०.००	०.००	०.००
४०	जखेरा एन सेलको टावर भएको दक्षिण तर्फ सिरीगाँउ जाने वाटो ग्रावेल	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
४१	फल्कापुर उत्तर तर्फ १६०० मि. कृषि नाला (आर.सि.सि.) निर्माण	७,५०,०००.००	७,२४,५९५.००	९६.६१	२५,४०५.००
४२	टिकुलीगढ लामाको घरनिर कुवा मर्मत	०.००	०.००	०.००	०.००
४३	बाल जनता मा वि बनगाँउमा माछा पोखरी निर्माण	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४४	मा.वि. फल्कापुर टोइलेट निर्माण	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४५	मजगाँउ क्रिसियन मण्डली ट्वाईलेट व्यवस्थापन	१,५०,०००.००	१,४५,५००.००	९७.००	४,५००.००
४६	मजगाँउ क्रिसियन मण्डली ट्वालेट निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
४७	पोल तथा ह्युम पाईप व्यवस्थापन	७,००,०००.००	६,७८,४८५.००	९६.९३	२१,५१५.००
४८	मा.वि. फल्कापुर निर्माणधिन भवन पलाष्टर	०.००	०.००	०.००	०.००
४९	मा वि फल्कापुर महिला ट्वाईलेट निर्माण	३,००,०००.००	२,८९,०३०.००	९६.३४	१०,९७०.००
५०	मजगाँउ थारु कल्याणकारी भवनमा पर्खाल तथा तार जाली	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
५१	टिकुलीगढ प्रा.वि. भवनको पलस्टर	४,००,०००.००	३,८४,९४२.००	९६.२४	१५,०५८.००
५२	बाल जनता मा.वि. वनगाँउ भवनको झ्याल ढोका मर्मत तथा स्तर उन्नती	५,००,०००.००	४,८४,५३१.००	९६.९१	१५,४६९.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००	६३,६०,७६०	५७.८२	४६,३९,२४०

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.४

सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,६२,०००.००	७५.००	५४,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	७०,०००.००	५५,०००.००	७८.५७	१५,०००.००
३	संचार महसुल	२५,०००.००	२५,०००.००	१००.००	०.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	४०,०००.००	०.००	०.००	४०,०००.००
५	सवारी साधन मर्मत	४०,०००.००	४०,०००.००	१००.००	०.००
६	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	७०,०००.००	६१,८६५.००	८८.३८	८,१३५.००
७	सेमरहवा सामुमदायिक भवन मर्मत संभार	०.००	०.००	०.००	०.००
८	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१००.००	०.००
९	पत्रपत्रिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	४०,०००.००	२०,०००.००	५०.००	२०,०००.००
१०	जापनिज भाषा तथा कोरियन भाषा सिकाइ	०.००	०.००	०.००	०.००
११	कम्प्युटर तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१२	बडा स्तरिय खेलकुद	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००	०.००
१३	गृहिणी महिलाहरुको लागि डल तथा कुशन तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	IsC Ag. बाली बिज्ञान डिप्लोमा तह CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त गरीब तथा जेहेन्दार	१,६०,०००.००	०.००	०.००	१,६०,०००.००

	छात्रावृत्ति अनुदान				
१५	अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम	४,००,०००.००	४,००,०००.००	१००.००	०.००
१६	अनुगमन मूल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च	५०,०००.००	४८,८००.००	९७.६०	१,२००.००
१७	विविध खर्च	१,८०,०००.००	१,५६,०४३.००	८६.६९	२३,९५७.००
१८	रेडक्रसलाई सहायता	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१९	एकल महिला तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि खानेपानी धारा जडान	३,००,०००.००	२,९६,५८१.००	९८.८६	३,४१९.००
२०	गुर्जिहवा टोल सुधार समिति नयाँ भवन निर्माण	८,००,०००.००	७,८६,७८१.००	९८.३५	१३,२१९.००
२१	बड्का घुम्ना सामुदायिक भवन निर्माण	१०,००,०००.००	९,२०,०५३.००	९२.०१	७९,९४७.००
२२	ल्यापटप खरिद	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
२३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	५९,०००.००	५८,५००.००	९९.१५	५००.००
२४	शान्तिनगर टोलको बाटो स्तरउन्नती	४,००,०००.००	३,८७,३४०.००	९६.८४	१२,६६०.००
२५	सेमरहवा विचकान घरदेखि कुलोसम्म बाटो स्तरउन्नति	६,००,०००.००	५,८१,४२४.००	९६.९०	१८,५७६.००
२६	चैलाही झरनहिया कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	८,००,०००.००	७,६४,३४०.००	९५.५४	३५,६६०.००
२७	पत्थरपुरुवा गाउँको बाटो स्तरउन्नती	२,००,०००.००	१,९२,४१४.००	९६.२१	७,५८६.००
२८	अर्नहवा शिव मन्दिर टोल ईन्द्र बहादुर वि.क. को घरदेखि खोला झर्ने बाटो एकतर्फि पक्कि नाला निर्माण	४,००,०००.००	३,८६,२०४.००	९६.५५	१३,७९६.००
२९	सानो घुम्नादेखि चरघरुवा टोलसम्म पक्की नाली निर्माण	८,००,०००.००	७,७४,१९०.००	९६.७७	२५,८१०.००
३०	अर्नहवा पूर्ण बहादुर डाँगीको घरदेखि उत्तर प्रकाश कवरको घरसम्म पक्की नाली निर्माण	८,००,०००.००	७,७०,९१६.००	९६.३६	२९,०८४.००
३१	चौलाही झरनहिया कुलोमा नाला निर्माण	१,००,०००.००	८२,५६०.००	८२.५६	१७,४४०.००
३२	अर्नहवा शिवमन्दिर टोल ईन्द्र वि.क. घर देखि खोल झर्ने एक तर्फि पक्की नाला निर्माण	२,००,०००.००	१,९०,८२९.००	९५.४१	९,१७१.००
३३	भैसकोर्मा सिक्टहवा कुलोमा कल्भर्ट निर्माण	१०,००,०००.००	९,६८,९३०.००	९६.८९	३१,०७०.००
३४	भैसकोर्मा सिक्टहवा कुलोमा RCCवाल तथा माटो पटान	२,००,०००.००	१,९३,८९५.००	९६.९५	६,१०५.००
३५	सेमरहवा दीप बोरिड संचालन	१,४०,०००.००	१,३५,७९४.००	९७.००	४,२०६.००
३६	सेमरहवा सामुदायिक भवन पछाडी भर्तिकल वाल निर्माण	२,००,०००.००	१,८७,१०१.००	९३.५५	१२,८९९.००
३७	वडा कार्यालयमा शौचालय निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३८	घुम्ना स्कूलको भवन मर्मत सम्भार तथा अधुरो शौचालय निर्माण	६,००,०००.००	०.००	०.००	६,००,०००.००
३९	गुर्जिहवा टोल सुधार समिति भवन मर्मत तथा तला थप	०.००	०.००	०.००	०.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००.००	९१,५६,५६०.००	८३.२४	१८,४३,४४०.००

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.५					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,४४,०००.००	६६.६७	७२,०००.००
२	संचार महसुल	१,००,०००.००	५,१३०.००	५.१३	९४,८७०.००
३	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
४	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	५०,०००.००	२२,५१०.००	४५.०२	२७,४९०.००
५	वडा भित्रका बाटो मर्मत	०.००	०.००	०.००	०.००
६	सडक बत्ति मर्मत	५,००,०००.००	४,९८,७०५.००	९९.७४	१,२१५.००
७	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,००,०००.००	३८,१९४.००	३८.१९	६१,८०६.००
८	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१,००,०००.००	९४,०००.००	९४.००	६,०००.००
९	दाड नेत्रहिन संघ दृष्टि विहिनलाई चाहिने सामग्री खरीद	१,००,०००.००	९९,६००.००	९९.६०	४००.००
१०	खिम बहादुर शाह मा.वि. कोलही स्कूलको फर्निचर तथा व्यवस्थापन	५,००,०००.००	३,८९,८५०.००	७७.९७	१,१०,१५०.००
११	असाहय तथा गरिब व्यक्तिहरु लाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको लागि आर्थिक सहयोग	०.००	०.००	०.००	०.००
१२	न्यूरोड टोल विकास क र ख लाइनमा विरुवा जोगाउन सार्वजनिक धारा जडान	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
१३	खेलकुद सामग्री खरीद	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१४	हेल्प डेस्क	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१,५०,०००.००	१,४६,४००.००	९७.६०	३,६००.००
१६	पूर्वाधार अवलोकन भ्रमण	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
१७	अनुभव आदान प्रदान तथा अवलोकन भ्रमण	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००	०.००
१८	विविध खर्च	५०,०००.००	२२,१००.००	४४.२०	२७,९००.००
१९	विविध खर्च	१,३४,०००.००	१,२४,७६०.००	९३.१०	९,२४०.००
२०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
२१	गोरक्ष टोलमा बाटो स्तरोन्नति	६,८०,०००.००	६,४६,१४५.००	९५.०२	३३,८५५.००
२२	गोरक्ष टोलमा बाटो स्तरोन्नति	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००.००	०.००
२३	सनलाईट टोलमा बाटो आर सि सि ढलान	५,००,०००.००	४,८३,९८५.००	९६.८०	१६,०१५.००
२४	घनश्याम न्यौपाने को घर देखि मधु न्यौपानेको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
२५	कोलही देखि बसन्तनगर जाने बाटोमा पक्की नाली बाटो स्तरोन्नति र जाली निर्माण (शहरी विकास कार्यक्रम संग म्याचिङ)	७,००,०००.००	०.००	०.००	७,००,०००.००
२६	सिताराम चौधरीको घर देखि लङ्गडी जाने बाटो स्तरबृद्धि	१०,००,०००.००	९,६७,९२३.००	९६.७९	३२,०७७.००
२७	तारा सुनारको घडेरी देखि दक्षिण बाट पश्चिम हरि पोखेल को घर सम्म बाटोमा ब्लक विछ्याउने	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
२८	गोरक्ष टोल पक्की नाला निर्माण	४,५०,०००.००	४,२८,७४९.००	९५.२८	२१,२५१.००
२९	कोलही देखि बसन्तनगर जाने बाटोमा पक्की नाली बाटो स्तरोन्नति र जाली निर्माण	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००.००	०.००
३०	बयलडाँडा पक्की नाला निर्माण	८,००,०००.००	०.००	०.००	८,००,०००.००
३१	नापी कार्यालयको उत्तर हिरा चौधरीको घर देखि प्रेम अधिकारी को घर सम्म पक्की नाला	०.००	०.००	०.००	०.००
३२	न्यूरोडको पक्की सडकमा नालामा ढक्कन	२,००,०००.००	१,८७,६८८.००	९३.८४	१२,३१२.००
३३	लमही गल्लीको पुरानो नाला सुधार गरी पलम कडक्रीट नाला निर्माण	१५,००,०००.००	१४,५१,४४३.००	९६.७६	४८,५५७.००
३४	होमपाइप तथा विद्युत पोल व्यवस्थापन	५,००,०००.००	४,८२,९२०.००	९६.५८	१७,०८०.००

३५	कोलही कृषि नाला निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
३६	मदरसा नुरुल इस्लाम स्कूल भौतिक पूर्वाधार निर्माण	५,२०,०००.००	०.००	०.००	५,२०,०००.००
३७	मदरसा अहिले सुन्नत फैजाने रजा सिद्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
३८	कालिका दुर्गा मन्दिरमा मार्बल विच्छाउने	२,००,०००.००	१,९१,९२०.००	९५.९६	८,०८०.००
कुलजम्मा		१,१३,००,०००.००	७५,२६,०२२.००	६६.६	३७,७३,९७८.००

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.६					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन		खर्च	मौज्दात
				खर्च (%)	
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	२,१६,०००.००	१००.००	०.००
२	पानी तथा बिजुली	८०,०००.००	८०,०००.००	१००.००	०.००
३	संचार महसुल	३०,०००.००	११,०००.००	३६.६७	१९,०००.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६०,०००.००	४७,६९३.००	७९.४९	१२,३०७.००
५	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	६०,०००.००	०.००	०.००	६०,०००.००
६	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	६०,०००.००	२,६२५.००	४.३८	५७,३७५.००
७	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३५,०००.००	१६,०००.००	४५.७१	१९,०००.००
८	अन्य कार्यालय संचालन खर्च	१,२९,०००.००	५४,०००.००	४१.८६	७५,०००.००
९	घोडेवासका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई यातायात सुविधा	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	थारु राष्ट्रिय कलाकार मञ्चलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
११	मेयरकपका लागि सामाग्री सहयोग	१,००,०००.००	९८,०००.००	९८.००	२,०००.००
१२	देउपुर स्कूलमा शैक्षिक सामाग्री खरिद	१,५०,०००.००	१,४९,४९९.००	९९.६७	५०१.००
१३	दुमदुमा मेला व्यवस्थापनका लागि सहयोग	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
१४	अपाङ्गमैत्री संस्थालाई मुँढा बनाउने तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	सिलाई कटाई तालिम सञ्चाल	४,००,०००.००	३,९८,८०५.००	९९.७०	१,१९५.००
१६	दुमदुमा स्कूलमा शैक्षिक सामाग्री खरिद	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
१७	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	९०,०००.००	९०,०००.००	१००.००	०.००
१८	विविध खर्च	१,२०,०००.००	१,०२,७६०.००	८५.६३	१७,२४०.००
१९	कुलमोहर टोलको चर्च मर्मत सम्भार	५०,०००.००	४८,२५०.००	९६.५०	१,७५०.००
२०	आँखा शिविर संचालन	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००

२१	स्वर्गद्वारी टोलको चर्च मर्मत सम्भार	५०,०००.००	४८,२००.००	९६.४०	१,८००.००
२२	खैरी टोलको चर्चमा बाल निर्माण	५०,०००.००	४७,०६०.००	९४.१२	२,९४०.००
२३	विपन्न परिवारलाई निःशुल्क धारा वितरण	३,००,०००.००	२,९३,०८०.००	९७.६९	६,९२०.००
२४	घरभाडा	१,२०,०००.००	१,२०,०००.००	१००.००	०.००
२५	बलरामपुर टोलमा महिला भवन निर्माण	५,००,०००.००	४,८०,४६०.००	९६.०९	१९,५४०.००
२६	बाटो स्तर उन्नती पिपल बोरिङ्ग टोल	५,००,०००.००	४,८५,०००.००	९७.००	१५,०००.००
२७	प्रगति टोलमा कोलही देखि देउपुर जोड्ने बाटोलाई स्तरोन्नती	५,००,०००.००	४,६६,२६३.००	९३.२५	३३,७३७.००
२८	वड्का गल्ली टोलमा दोकही चौराहा देखि राम बहादुरको घर जाने बाटोमा पक्की नाला निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
२९	मध्यनगर खत्री टोलमा अधुरो नाली निर्माण	५,००,०००.००	४,८५,०००.००	९७.००	१५,०००.००
३०	कुमोहरमा अधुरो पक्की नाला निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३१	दर्शन टोलमा देउपुर स्कुल दक्षिणको पिच रोड देखि दक्षिणको बाटोमा पक्की नाला	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३२	शान्ति नगर टोलमा अधुरो पक्की नाला निर्माण	५,००,०००.००	४,८३,९७७.००	९६.८०	१६,०२३.००
३३	स्वर्गद्वारी टोलमा अधुरो कच्ची बाटो ग्राभेल	५,००,०००.००	२,५०,०००.००	५०.००	२,५०,०००.००
३४	राप्ती टोलमा मध्यनगर चोक देखि ढिकपुर सम्मको अधुरो पक्की नाली निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३५	वड्का गल्ली टोलमा प्रदिप चौधरीको घर नजिक कल्भर्ट निर्माण	२,५०,०००.००	२,४२,५००.००	९७.००	७,५००.००
३६	सञ्चार टोलमा हरि धितालको घर देखि पक्की नाला निर्माण	५,००,०००.००	४,७९,८४५.००	९५.९७	२०,१५५.००
३७	आदर्श टोलमा बाटो ग्राभेल	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
३८	आदर्श टोलमा बाटो ग्राभेल	१,५०,०००.००	१,३४,९८५.००	८९.९९	१५,०१५.००
३९	लंगडि टोलमा सानो राप्ती नदी जाने दमोदर रोड स्तरोन्नती साथै पक्की नाला	५,००,०००.००	४,८०,९४०.००	९६.१९	१९,०६०.००
४०	लंगडि टोलमा अधुरो पक्की नाला निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
४१	घोडेवासमा बाटोको उत्तरमा पक्की नाला निर्माण	२,००,०००.००	१,८८,०००.००	९४.००	१२,०००.००

४२	राप्ती टोलमा ढिकपुर देखि लंगडि जाने बाटोमा ग्राभेल	१,५०,०००.००	१,३१,९९४.००	८८.००	१८,००६.००
४३	छुटकी महरवा टोलमा ग्राभेल	२,००,०००.००	१,९०,४५०.००	९५.२३	९,५५०.००
४४	छुटकी महरवामा ए.टि.एम. कटेज निर कल्भर्ट निर्माण	५,००,०००.००	४,८४,०००.००	९६.८०	१६,०००.००
४५	अधुरो महिला भवन निर्माण खैरी टोल	५,००,०००.००	४,८३,७४२.००	९६.७५	१६,२५८.००
४६	दुमदुमा कृषि सहकारी संस्थाको भवनको दोस्रो तला निर्माण	२,००,०००.००	१,९३,३७४.००	९६.६९	६,६२६.००
४७	बलरामपुर टोलमा मरुवा निर्माण	१,००,०००.००	९६,०००.००	९६.००	४,०००.००
४८	बेलदमार पक्की पर्खाल निर्माण	१,००,०००.००	९६,९४५.००	९६.९५	३,०५५.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००	७७,७६,४४७	७०.६९	३२,२३,५५३

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.७					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,३५,०००.००	६२.५०	८१,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	५०,०००.००	३१,६१४.००	६३.२३	१८,३८६.००
३	संचार महसुल	१४,०००.००	१४,०००.००	१००.००	०.००
४	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६०,०००.००	४६,२५१.००	७७.०९	१३,७४९.००
५	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	४०,०००.००	१,६१०.००	४.०३	३८,३९०.००
६	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	८०,०००.००	११,५६५.००	१४.४६	६८,४३५.००
७	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	४०,०००.००	२८,०००.००	७०.००	१२,०००.००
८	वडाको वृत्तचित्र निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
९	बृद्ध बृद्धा सम्मान कार्यक्रम	५,००,०००.००	४,९८,६१७.००	९९.७२	१,३८३.००
१०	मौरीघार तथा आधार चाकाका लागी सहयोग	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००	०.००
११	बेमौसमी तरकारी खेती तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१२	तिज मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१३	कम्प्युटर तालिम	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
१४	अपांगलाई फिनेल बनाउने तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	दलित विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लाई शैक्षिक सामग्री वितरण	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन	८,००,०००.००	५,००,०००.००	६२.५०	३,००,०००.००
१७	माघि मिलन सांस्कृतिक कार्यक्रम	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
१८	नयाँ बस्तीमा निशूलक खानेपानी मिटर वितरण	१,७५,०००.००	०.००	०.००	१,७५,०००.००

१९	सिलाइ कटाई तालिम	४,००,०००.००	२,००,०००.००	५०.००	२,००,०००.००
२०	शिक्षा सचेतना कार्यक्रम	०.००	०.००	०.००	०.००
२१	सिंचाई पाइप विस्तार बनघूसी	१,५०,०००.००	१,४५,५००.००	९७.००	४,५००.००
२२	सूईटर बूनाई तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२३	एकल महिला सम्मान कार्यक्रम	५,००,०००.००	३,८६,८४०.००	७७.३७	१,१३,१६०.००
२४	पलम्बर तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२५	विविध कार्यक्रम खर्च(हेल्प डेस्क संचालन)	२,००,०००.००	१,०३,६३०.००	५१.८२	९६,३७०.००
२६	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१,००,०००.००	६,२५०.००	६.२५	९३,७५०.००
२७	विविध खर्च	१,००,०००.००	६३,२९५.००	६३.३०	३६,७०५.००
२८	त्रिशक्ती बाल विकास केन्द्र सहायता	२,५०,०००.००	२,४२,२४८.००	९६.९०	७,७५२.००
२९	अर्जुन मा.वि.हसनापूरलाइ सहयोग	०.००	०.००	०.००	०.००
३०	घरभाडा	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
३१	जनकपूरमा सामुदायिक भवन निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
३२	हसनापूरमा सामुदायिक भवन निर्माण	०.००	०.००	०.००	०.००
३३	नयाँ वस्तिमा सतसंग भवन स्तरोन्नती	४,००,०००.००	३,८८,०००.००	९७.००	१२,०००.००
३४	गेट निर्माण हसनापुर	९,००,०००.००	०.००	०.००	९,००,०००.००
३५	ट्रान्सफर्मर खरिद तथा जडान	५,००,०००.००	९९,५०२.००	१९.९०	४,००,४९८.००
३६	पश्चिम बनघूसी बाटो स्तरउन्नती	०.००	०.००	०.००	०.००
३७	डाइभर टोल कल्भर्ट निर्माण	५,००,०००.००	४,८२,५९६.००	९६.५२	१७,४०४.००
३८	भरत लाल चौधरीको घर देखि जाने बाटो स्तरउन्नती	९,००,०००.००	८,७३,०००.००	९७.००	२७,०००.००
३९	खल्लो टोलमा बाटो स्तरउन्नती	५,००,०००.००	४,८३,९०१.००	९६.७८	१६,०९९.००
४०	हसनापुर कट्टा जाने बाटो स्तरोन्नती	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४१	टिका घर्तीको घर देखि जाने बाटो स्तरउन्नती	९,००,०००.००	८,७३,०००.००	९७.००	२७,०००.००
४२	बिजुली विस्तार तथा ट्रान्सफार्म जडान	७,००,०००.००	५,९६,५२७.००	८५.२२	१,०३,४७३.००
४३	बनगै खानेपानी मोटर तथा विद्युत जडान	३,२५,०००.००	२,७३,५५२.००	८४.१७	५१,४४८.००
४४	व्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
४५	फचकपूर कष्टमहारिड खल्लो टोल	१,५०,०००.००	१,४५,५००.००	९७.००	४,५००.००
४६	हसनापुरमा चौतारी निर्माण	२,५०,०००.००	२,४२,५००.००	९७.००	७,५००.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००.००	७०,२२,४९८.००	६३.८४	३९,७७,५०२.००

आ.व. : २०७९/८० अवधि : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.८					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	२,१६,०००.००	१,४४,०००.००	६६.६७	७२,०००.००
२	विद्युत तथा संचार महशुल	५०,०००.००	२२,२२८.००	४४.४६	२७,७७२.००
३	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	४५,०००.००	४४,५२७.००	९८.९५	४७३.००
४	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	७५,०००.००	०.००	०.००	७५,०००.००
५	जहरे सामुदायिक भवन फर्निचर र रङ्गरोगन	१,००,०००.००	३०,६१२.००	३०.६१	६९,३८८.००
६	असानीमा सन्देश चर्च रङ्गरोगन	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
७	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००.००	०.००
८	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	५०,०००.००	२९,०००.००	५८.००	२१,०००.००
९	कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
१०	वडा कार्यालयको लागि सामग्री खरिद	३,३०,०००.००	८९,०००.००	२६.९७	२,४१,०००.००
११	होम पाइप व्यवस्थापन	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१२	हेल्प डेस्क	१,८०,०००.००	१,१६,५८०.००	६४.७७	६३,४२०.००
१३	बाल शिक्षा	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	अति विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री र अतिरिक्त क्रियाकलाप	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
१५	जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	युवाका लागि सिपमूलक तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१७	विपद् व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००.००	०.००
१८	टेङ्गेन्या मन्दिरमा धार्मिक कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार	५०,०००.००	५०,०००.००	१००.००	०.००
१९	महिलाका लागि सिपमूलक तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२०	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	१,००,०००.००	८,९५०.००	८.९५	९१,०५०.००
२१	विविध खर्च	२,१४,०००.००	१,५५,२४६.००	७२.५४	५८,७५४.००
२२	विविध खर्च	४,००,०००.००	०.००	०.००	४,००,०००.००
२३	आ.वि. भत्तरकुण्डालाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन र विद्युत बाईरिङ्ग	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	राप्ति मा.वि. उचा निम्बुमा शुद्ध खानेपानीको लागि फिल्टर	३,५०,०००.००	०.००	०.००	३,५०,०००.००
२५	आ वि भत्तरकुण्डालाई कक्षा कोठा व्यवस्थापन र फर्निचर	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
२६	गणेशपुरमा बिहारीको घर निरको सडकमा पक्की नाली निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
२७	केशर बहादुर बुढाको घरनिर कल्भर्ट निर्माण	२,५०,०००.००	०.००	०.००	२,५०,०००.००
२८	बिजुलिपुरमा ग्रभेल र बाटो स्तरोन्नती	३,४०,०००.००	३,२९,२३६.००	९६.८३	१०,७६४.००
२९	बलबहादुर घर्तिको घर देखि नेवारको घर सम्म बाटो ग्रभेल	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
३०	बलबहादुर घर्तिको घर देखि नेवारको घर सम्म बाटो ग्रभेल	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
३१	झगु थापाको घरनिर कल्भर्ट निर्माण	१,३०,०००.००	०.००	०.००	१,३०,०००.००
३२	भौकागाउँमा पक्की नाली निर्माण	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३३	पोल तार खरिद	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
३४	निम्बुखुट्टी भगत चौधरीको घर देखि पूर्व खोला सफाइ र नाला निर्माण	३,००,०००.००	२,८९,२५०.००	९६.४२	१०,७५०.००
३५	निम्बुखुट्टी यादव योगी टोलमा सिँचाईको	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००

	लागि मोटर र पाईप खरिद				
३६	सतबरिया जहरे खानेपानी विस्तार र भवन निर्माण	२५,००,०००.००	०.००	०.००	२५,००,०००.००
३७	भत्तरकुण्डा देखि अरानी सम्म शुद्ध खानेपानी पाईप विस्तार र मिटर जडान	०.००	०.००	०.००	०.००
३८	प्रसंशा चर्च खोलीगाउँमा शौचालय	१,४०,०००.००	०.००	०.००	१,४०,०००.००
३९	विचकागाउँमा सामुदायिक भवनको लागि शौचालय	१,४०,०००.००	०.००	०.००	१,४०,०००.००
४०	राप्ती मा वि उच्चानिम्बु पार्किङ निर्माण	२,००,०००.००	०.००	०.००	२,००,०००.००
४१	निम्बुखुटीमा दलित सामुदायिक निर्माणाधिन भवनको पेटी निर्माण	१,००,०००.००	०.००	०.००	१,००,०००.००
४२	विजुलीपुर पुलमा रेलिङ्ग	२,००,०००.००	१,९२,१२७.००	९६.०६	७,८७३.००
४३	प्रा वि आसानीमा शौचालय निर्माण	३,००,०००.००	२,९०,०००.००	९६.६७	१०,०००.००
४४	अरानीमा काङ्गी हाउस गौशाला	०.००	०.००	०.००	०.००
४५	गिधिनिया गाउँमा सामुदायिक भवनको लागि शौचालय	१,४०,०००.००	०.००	०.००	१,४०,०००.००
४६	सतबरिया सामुदायिक भवन र खेलकुद मैदानमा माटो फिलिङ	१,५०,०००.००	०.००	०.००	१,५०,०००.००
४७	प्रा.वि. अरानीको अधुरो भवन निर्माण	३,००,०००.००	०.००	०.००	३,००,०००.००
४८	सतबरिया प्रहरी चौकीमा तारबार	५,००,०००.००	०.००	०.००	५,००,०००.००
कुल जम्मा		१,१०,००,०००.००	२०,९०,७५६.००	१९	८९,०९,२४४.००

आ.व. : २०७९/८० अवधी : २०७९/०४/०१-२०८०/०३/३१ बजेट उपशीर्षक : लमही नगरपालिकावडा नं.९					
सि.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	कर्मचारीको बैठक भत्ता	२९६,०००.००	१८०,०००.००	८३.३३	३६,०००.००
२	पानी तथा बिजुली	३०,०००.००	३०,०००.००	१००.००	०.००
३	पानी तथा बिजुली	३०,०००.००	२८,७२८.००	९५.७६	१,२७२.००
४	संचार महसुल	६५,०००.००	६५,०००.००	१००.००	०.००
५	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६०,०००.००	५९,६००.००	९९.३३	४००.००
६	सवारी साधन मर्मत खर्च	२०,०००.००	०.००	०.००	२०,०००.००
७	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	२०,०००.००	०.००	०.००	२०,०००.००
८	प्रा. वि. हर्दवामा रङरोगन	१००,०००.००	९७,०००.००	९७.००	३,०००.००
९	शिव मन्दिर तथा धर्मशाला मर्मत (चाँदनी टोल)	१५०,०००.००	१४५,५००.००	९७.००	४,५००.००
१०	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१००,०००.००	०.००	०.००	१००,०००.००
११	पत्रपत्रिका, छुपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	२०,०००.००	०.००	०.००	२०,०००.००
१२	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड मा वि अमेलिया	४०,०००.००	०.००	०.००	४०,०००.००
१३	दलित महिला आय आर्जन सिपमुलक तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	विपद व्यवस्थापन	२५०,०००.००	२१८,३१६.००	८७.३३	३१,६८४.००
१५	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (बाङ्गेताल)	३५,०००.००	३१,०००.००	८८.५७	४,०००.००
१६	खानेपानी रिड कुवा निर्माण (हात्तीखाल)	३५,०००.००	३३,८२१.००	९६.६३	१,१७९.००

१७	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (भत्तकुण्डी)	७०,०००.००	६७,९००.००	९७.००	२,१००.००
१८	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (नौला टोल जलकुण्डी)	३५,०००.००	३३,९५०.००	९७.००	१,०५०.००
१९	लमही आँखा अस्पताल	१००,०००.००	०.००	०.००	१००,०००.००
२०	युवाको लागि सिपमुलक तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२१	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड मा वि रिहार	४०,०००.००	०.००	०.००	४०,०००.००
२२	बाल अधिकार तथा नेतृत्व विकास तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२३	महिला सिप विकास तालिम	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गतालाई सम्मान कार्यक्रम	४००,०००.००	३९९,९६९.००	९९.९९	३९.००
२५	वडा कार्यालय व्यवस्थापन	४००,०००.००	०.००	०.००	४००,०००.००
२६	खेल मैदान तथा खेल सामग्री खरिद (तेलिया)	१००,०००.००	९६,४५५.००	९६.४६	३,५४५.००
२७	बाल विकास सामग्री खरिद	१००,०००.००	०.००	०.००	१००,०००.००
२८	बगार बाबा धार्मिक विकास संस्थामा सामग्री खरीद (वडा कार्यालय मार्फत)	१५०,०००.००	१४९,७५३.००	९९.८४	२४७.००
२९	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	४०,०००.००	१७,२००.००	४३.००	२२,८००.००
३०	जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारी अध्ययन, अवलोकन भ्रमण	०.००	०.००	०.००	०.००
३१	विविध खर्च	२२९,०००.००	६९,११५.००	२६.६९	१६७,८८५.००
३२	विविध खर्च	२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
३३	मा. वि. रिहार स्कूल व्यवस्थापन	२५०,०००.००	२४२,५००.००	९७.००	७,५००.००
३४	खोप केन्द्र भवन निर्माण	८५०,०००.००	८२९,७५०.००	९६.६८	२०,२५०.००
३५	मा. वि. अमिलिया फर्नीचर मर्मत संभार	२००,०००.००	१९९,९२०.००	९९.९६	८०.००
३६	बाटो कटिड तथा विस्तार (कोल्टरा)	३००,०००.००	२८५,८६४.००	९५.२९	१४,१३६.००
३७	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (जुरपानी टोल)	३००,०००.००	०.००	०.००	३००,०००.००
३८	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (राप्ती भिमबाँध टोल)	३००,०००.००	२९९,०००.००	९७.००	९,०००.००
३९	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (रमेश वलीको घर देखि भित्री रिडरोड)	५००,०००.००	४७९,७८५.००	९५.९६	२०,२१५.००
४०	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल (मैने टोल)	०.००	०.००	०.००	०.००
४१	बाटो विस्तार (डवरगैया टोल तेलिया)	१५०,०००.००	१४४,९९०.००	९६.६६	५,०१०.००
४२	बाटो विस्तार तथा ग्राभेल — हर्दवा (प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको लागत सहभागीता)	४००,०००.००	०.००	०.००	४००,०००.००
४३	बाटो विस्तार (राउत टोल तेलिया)	१५०,०००.००	१४४,८४९.००	९६.५७	५,१५१.००
४४	पक्की नाली निर्माण (रिहार)	४००,०००.००	३८८,०००.००	९७.००	१२,०००.००
४५	वैद्य चिरामा भल नियन्त्रण	२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
४६	सिचाईको लागि ड्याम निर्माण (बुका खोला बाङ्गेताल)	०.००	०.००	०.००	०.००
४७	मोटर तथा पाईप खरीद (भत्तरकुण्डी)	२००,०००.००	१८८,०७०.००	९४.०४	११,९३०.००
४८	सिचाईको लागि विद्युत विस्तार (चाँदनी, गायत्री र शिवशक्ती टोल)	१,२००,०००.००	०.००	०.००	१,२००,०००.००
४९	सिचाईको लागि मोटर तथा पाइप खरीद (जलजला जलकुण्डी)	४००,०००.००	०.००	०.००	४००,०००.००

५०	सिचाइका लागी ट्यांकी र घर निर्माण जलकुण्डी तल्लो टोल	५०,०००.००	०.००	०.००	५०,०००.००
५१	सिचाईको लागी पाइप खरीद (तरुलिया)	२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
५२	स्यालेमा कुवा निर्माण	३५,०००.००	०.००	०.००	३५,०००.००
५३	मा विरिहारमा कुवा निर्माण	३५,०००.००	३३,९५०.००	९७.००	१,०५०.००
५४	खानेपानी विस्तार (घोयली)	४००,०००.००	०.००	०.००	४००,०००.००
५५	बडा कार्यालयमा कुवा निर्माण	३५,०००.००	०.००	०.००	३५,०००.००
५६	पैतेमा कुवा निर्माण	३५,०००.००	३३,९५०.००	९७.००	१,०५०.००
५७	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (कोल्तरा)	१००,०००.००	०.००	०.००	१००,०००.००
५८	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (तेलिया)	१७५,०००.००	१६९,७५०.००	९७.००	५,२५०.००
५९	खानेपानी रिडकुवा निर्माण (तरुलिया)	२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
६०	खानेपानी पाइप खरीद तथा विस्तार (धवारी)	४००,०००.००	३८३,९४५.००	९५.९९	१६,०५५.००
६१	बडा कार्यालय परिसरमा चमेना गृह निर्माण	२००,०००.००	०.००	०.००	२००,०००.००
६२	चौपारी निर्माण (कर्मठ भवन अगाडी)	१००,०००.००	९७,०००.००	९७.००	३,०००.००
६३	ट्रष्ट निर्माण गुप्तीताल	२००,०००.००	१८६,३९०.००	९३.२०	१३,६१०.००
कुल जम्मा		११,०००,०००.००	५,८०७,०१२.००	५२.७९	५,१९२,९८८.००

नगरपालिकाको समग्र आर्थिक प्रगति :

क्र.सं.	बजेट विवरण	बजेट रकम रु	खर्च रकम रु	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	६४,६०,५४,०००	४६,०७,९३,१७७.४०	७१.३१	
२	पुजिगत	७१,७०,४४,७५७	५०,५२,७०,९७२.६९	६३.३९	
कुल जम्मा		१,४४,३०,९८,७५७	९६,६०,६४,१५०.०९	६६.९४	

कार्यक्रमका केहि फोटोहरु

राजश्व शाखाबाट भएका विभिन्न कार्यक्रमका केहि तस्विरहरु









स्वास्थ्य शाखाबाट भएका कार्यक्रमका केहि फोटोहरु







विपद् व्यवस्थापन र पर्यटन शाखा अन्तर्गत भएका कार्यक्रममा तस्विरहरु





सामी कार्यक्रमका तस्विरहरु





शिक्षा शाखाबाट भएका कार्यक्रमहरुको फोटोहरु





महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा









योजना तथा अनुगमन शाखाबाट गरिएका विभिन्न आयोजनाहरुका तस्विरहरु



आयोजना सूचना पाटी

आयोजनाको नाम: सुरेशको मिल देखि अर्जुनखोला सम्म दायाँ बायाँ दुवै तर्फ नाली
बाटो ग्रामेल उपमोक्ता समिति

आयोजना संचालन गर्ने कार्यालयको नाम: लमही नगरपालिका
उपमोक्ता समितिको नाम: दिपक थापा (९८०९३७०९८०)

आयोजनाको कूल लागत रकम: २००२४८७.६२

८. १. आयोजनामा कार्यालयबाट ब्यहोर्ने लागत रकम: २००००००/-

८. २. जनश्रमदान: २४८७.६२

८. ३. आयोजनामा लगानी गर्ने अन्य निकायको नाम र ब्यहोर्ने लागत रकम:

१. आयोजना सम्मोक्षा मिति: २०७८/११/१०

२. आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति: २०८०/०३/१०

३. आयोजनाबाट लाभान्वित जनसंख्या: ११०० जना २६५ घरघुरी





घोडेबास जोडने बाटो स्तरोन्नती वडा नम्बर ८

धेनिया र नयाबस्तिमा बाटो र नाला
वडा नम्बर ८



मेरेनी सिमसार आयोजना वडा नम्बर ८





घुम्ना कुलोमा कल्भर्ट वडा नं. २



सवदाह स्थलमा किरियापुत्री भवन निर्माण वडा नं. २



खेल मैदान टोल जाने बाटो निर्माण वडा नं. १



सितलापुर बौराहा जाने बाटो निर्माण वडा नं. १




टिकुलीगढ बाटो निर्माण वडा नं. ३



मा.वि बनगाउँ रडरोगन वडा नं.३



त नागरिक आवास कार्यक्षीत नागरिक आवास का

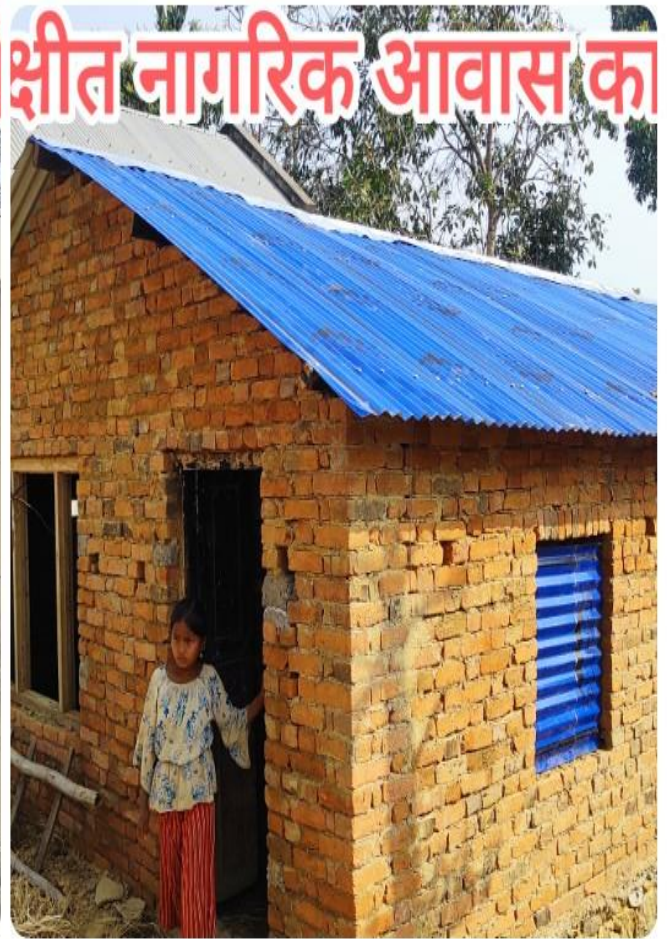

रक्षीत नागरिक आवास का



त नागरिक आवास का

